


3. Estructura operativa

La estructura operativa que se utilizó fue la siguiente:

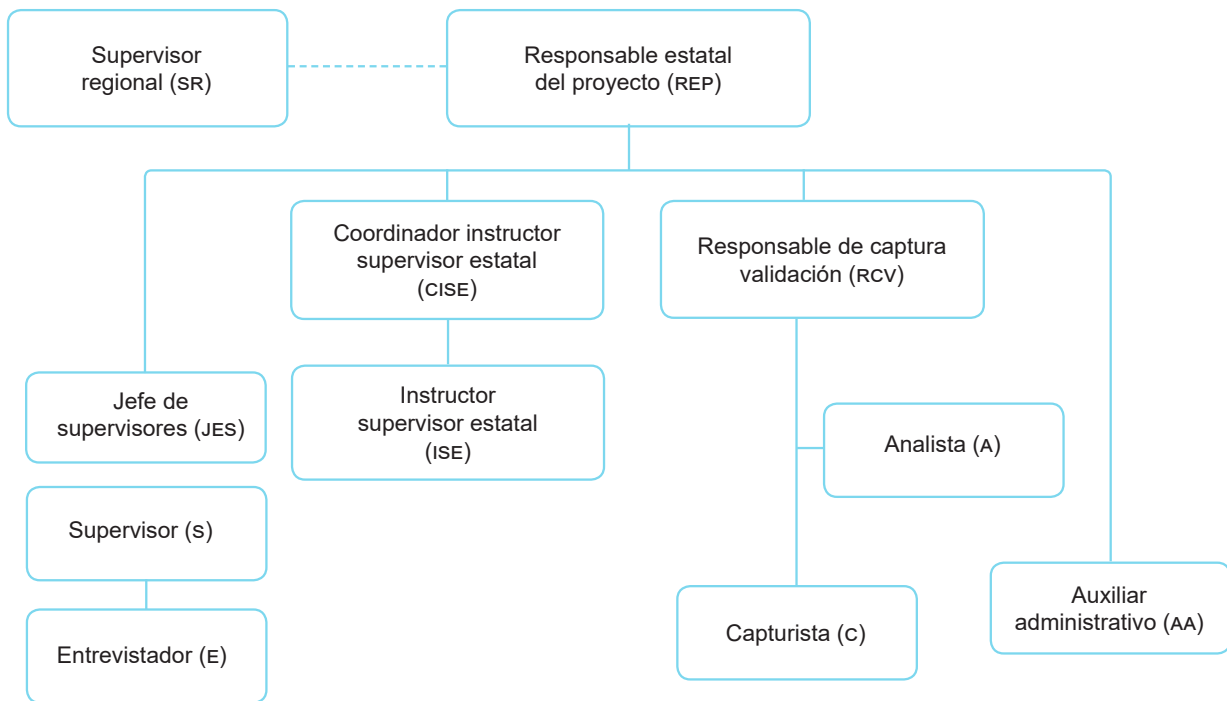

Con objeto de garantizar la mayor calidad del levantamiento se definieron las tareas y actividades del personal operativo.

Responsable estatal del proyecto (REP)

- Es el responsable del proyecto en la Coordinación Estatal
- Coordinar, planear, vigilar y evaluar el levantamiento de la encuesta en su oficina administrativa
- Asignar la muestra enviada por Oficina Central
- Distribuir las cargas de trabajo al personal de campo, como al de oficina de captura validación
- Solicitar al jefe de departamento de operativos sociodemográficos regulares, los recursos financieros y materiales necesarios para el funcionamiento de la encuesta (viáticos, pasajes, gasolina, papelería, etcétera)
- Asesorar en los problemas relacionados con la información recolectada por incongruencias, errores o falta de información
- Asesorar en los problemas relacionados con la recuperación de la información por negativa del informante a dar información o término de la entrevista
- Elaborar informes decenales para la Subdirección de Operativos de Encuestas de Ingresos y Gastos, sobre el estado de avance del levantamiento, reportar los problemas conceptuales y las dificultades en la muestra que le fue asignada
- Planear la asignación de la muestra al personal operativo

El REP fue responsable de la Oficina Estatal y de la(s) auxiliar(es) correspondiente(s).

Coordinador instructor supervisor estatal (CISE)

- Coordinar la impartición de la capacitación a los entrevistadores, supervisores, responsable de captura validación y analistas
- Analizar y asesorar los casos de información con problemas de congruencia en campo, en captura y en validación
- Dar reinstrucción operativa o conceptual a entrevistadores, supervisores, jefe de supervisores, instructor supervisor estatal, analistas y responsable captura validación
- Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma las actividades del ISE

Instructor supervisor estatal (ISE)

- Impartir y coordinar la capacitación a los entrevistadores y supervisores
- Analizar y asesorar los casos de información con problemas de congruencia en campo, en captura y en validación
- Dar reinstrucción operativa y/o conceptual a entrevistadores, supervisores, jefe de supervisores, analistas y responsable captura validación
- Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades de cada una de las figuras operativas a su cargo

Jefe de supervisores (JES)

- Verificar y actualizar los listados de vivienda y su cartografía conjuntamente con el área de la Muestra Maestra
- En caso especial apoyar al responsable estatal del proyecto en la distribución, organización, asignación y control de las cargas de trabajo
- Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades de cada uno de los supervisores a su cargo.
- Dar reinstrucción operativa y/o conceptual al personal a su cargo

Supervisor (s)

- Llevar el control estricto de las entrevistas asignadas a su grupo de entrevistadores durante el levantamiento
- Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades de cada uno de los entrevistadores a su cargo
- Apoyar a los entrevistadores en la realización de las entrevistas cuando las cargas de trabajo lo requieren
- Aplicar la observación directa a cada uno de los entrevistadores a su cargo, durante las primeras decenas del levantamiento, hasta cubrir el total de entrevistadores que se le asignaron
- Verificar los casos de no respuesta total o parcial y determinar las soluciones
- Verificar la correcta captación de la información para hacer las observaciones pertinentes a cada uno de los entrevistadores a su cargo
- Concentrar y revisar las cargas de trabajo de cada uno de los entrevistadores

Entrevistador (E)

- Revisar que la documentación entregada por el supervisor esté completa y debidamente identificada
- Ubicar el área de trabajo e identificar la manzana y viviendas seleccionadas
- Verificar que la dirección o domicilio del listado coincida con la vivienda seleccionada
- Detectar a los informantes adecuados en el hogar y aplicar los cuestionarios de acuerdo con las normas establecidas
- Identificar la existencia de otros hogares en la vivienda y recabar su información
- Informar a su supervisor de cualquier irregularidad o duda, tanto de problemas de ubicación e identificación, como de negativas de los informantes a la brevedad posible
- Recuperar la información requerida cuando sea necesario
- Capacitar al informante adecuado para el llenado del Cuadernillo de gastos diarios

Responsable de captura validación (RCV)

- Coordinar, controlar y evaluar las actividades concernientes al procesamiento de la información
- Asesorar a capturistas y analistas para que las actividades se realicen en los tiempos establecidos
- Asesorar y supervisar el proceso de captura
- Asesorar a los capturistas con respecto al Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos Estadísticos (IKTAN)
- Recibir los cuestionarios, listados de viviendas y formas de control del responsable estatal del proyecto para la validación y codificación
- Asignar y controlar las cargas de trabajo para la validación
- Asesorar y apoyar las actividades de los analistas
- Revisar que los cuestionarios cumplan con los lineamientos de calidad durante la validación

Analista (A)

- Revisar que la documentación proveniente de campo esté completa
- Analizar la congruencia y consistencia de la información y consultar a supervisores y entrevistadores en caso de duda
- Sugerir al coordinador instructor supervisor estatal y al responsable de captura validación los retornos a campo necesarios para recuperar información
- Liberar los cuestionarios en el sistema IKTAN

Capturista (c)

- Transferir la información recabada en los cuestionarios hacia un medio electrónico por medio de la digitación de los datos
- Reportar al responsable de captura validación cualquier anomalía en el equipo asignado y en el sistema de captura
- Recibir y entregar los cuestionarios ya capturados en el orden en que fueron entregados por el responsable de captura validación
- Verificar que los cuestionarios capturados completamente, tengan el estatus de concluidos en el IKTAN

Auxiliar administrativo (AA)

- Apoyar en el trámite de los recursos necesarios para el levantamiento
- Apoyar en la solicitud de vehículos y vales de gasolina
- Apoyar en el trámite de viáticos y pasajes en los tiempos previstos para el levantamiento
- Solicitar los insumos de papelería para el trabajo de campo y de oficina

Supervisor regional (SR)

- Supervisar el cumplimiento de las actividades de supervisión y reinstrucción del responsable estatal de proyecto, coordinador instructor supervisor estatal e instructor supervisor estatal, al personal en campo
- Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades del jefe de supervisores, supervisores y entrevistadores en campo
- Aplicar la observación directa a los entrevistadores que supervise
- Apoyar a los entrevistadores y supervisores a hacer labor de convencimiento con los informantes renuentes
- Dar reinstrucción operativa y/o conceptual al personal supervisado
- Verificar la correcta captación de la información para hacer las observaciones pertinentes al material revisado por el supervisor y jefe de supervisores

6. Procesamiento de la ENIGH en la red institucional

Durante la vigencia del levantamiento de la ENIGH 2024 se utilizó la plataforma de la ENIGH en la red institucional (intranet INEGI), por medio del navegador Google Chrome se contó con dos instrumentos informáticos: el sitio de colaboración y el Sistema de Seguimiento y Control (IKTAN).

6.1 Sitio de colaboración de la ENIGH 2024

Tiene la finalidad de facilitar la comunicación en línea entre el personal de las Coordinaciones Estatales y la Oficina Central, por lo que se habilitó este sitio el cual incluye funciones de colaboración basadas en un navegador *web*, conocido como sitio de colaboración de la ENIGH 2024, el cual se utilizó para exponer y aclarar las dudas operativas y conceptuales que surgieron en el operativo de campo, así como para el acceso a instrucciones y avisos de actualizaciones o procedimientos, ya que este sistema cuenta con disponibilidad de 24 horas.

6.2 Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos Estadísticos (IKTAN)

El IKTAN es un sistema informático, cuyo propósito es mantener un flujo de información actualizada del avance del levantamiento en sus distintas etapas.

Está conformado por tres módulos:

- 1) Con el primer módulo se lleva el control y se da seguimiento a:
 - El operativo de campo mediante el registro del personal, el control de la muestra, la asignación de cargas de trabajo y la captura de las formas de control ENIGH, para conocer el avance de recolección de la información de cada entidad federativa
 - El proceso de captura a través de la asignación de cargas de trabajo, la captura de todos los cuestionarios que conforman un folio y la generación de reportes del IKTAN, para conocer el avance de captura de información
 - El proceso de revisión, el cual consiste en que el RCV realiza la recaptura del 10 % de folios capturados por cada capturista, y solicita una recaptura en caso de ser necesaria
 - El proceso de validación mediante la asignación de cargas de trabajo, la verificación de los rangos válidos y la consistencia e integridad de la información de cada uno de los folios capturados
- 2) El segundo módulo permite el acceso a las plantillas para la captura de la información recolectada en los instrumentos de captación.
- 3) El tercer módulo consta de rutinas de validación para garantizar la integridad de la información recabada en campo.

7. Los procesos de operación de la ENIGH 2024

A las Oficinas Estatales les corresponde llevar a cabo el operativo de campo en donde se realizan los siguientes procesos: levantamiento de información, supervisión, captura y validación de la información.

7.1 Operativo del levantamiento

Para cubrir los requerimientos del marco conceptual diseñado para la ENIGH 2024 se programó la recolección de información en diez levantamientos, cada uno de ellos organizado en diez días. El levantamiento se realizó del día 11 de agosto al 18 de noviembre de 2024. Cabe aclarar que además hubo dos actividades complementarias. Una de ellas tuvo verificativo del 1 al 8 de agosto de 2024, en el que se realizó un ensayo completo del levantamiento. La otra actividad consistió en la implementación de una decena de recuperación del 19 al 28 de noviembre, la cual sirvió para recuperar cuestionarios con no respuesta y levantar las cargas de trabajo que hubiesen quedado pendientes en decenas anteriores.

7.1.1 Actividades durante el levantamiento

Cada decena está conformada por diez días, donde para cada día se definieron actividades específicas para el levantamiento de la información:

El primer día de la decena se establece el contacto inicial con el jefe del hogar, el ama de casa o con una persona mayor de 18 años, explicándole los objetivos de la encuesta; se levanta la información del Cuestionario de hogares y vivienda; se sondea quién es la persona o personas que realizan las compras de los alimentos, bebidas y tabaco para el consumo del hogar en su conjunto; se capacita a esta persona o personas en el llenado del Cuadernillo de gastos diarios, y se explica al informante que se entrevistará personalmente a las personas de 12 o más años, preguntando por los horarios en que se les puede localizar y concertando citas con cada uno de ellos.

El segundo día de visita al hogar se dedica a preguntar sobre los demás gastos en el Cuestionario de gastos del hogar, sondeando qué integrantes del hogar realizan gastos personales o el pago de algún servicio u otros gastos para el hogar en su conjunto.

Del tercero al séptimo día de la decena, se capta la información de todos los integrantes del hogar en el siguiente orden: primero se levanta la información del Cuestionario para personas de 12 o más años y el Cuestionario de negocios y se le pregunta sobre los gastos que esta persona realiza de forma personal o para el hogar, para hacer el registro correspondiente en el Cuestionario de gastos. Si el informante conoce la información de los menores de 12 años, se distribuyen esas entrevistas en el resto de los días. Todos los días se revisa la información registrada en el Cuadernillo de gastos diarios y si existen problemas en el registro se sondea al informante.


El sexto día de la decena, solicita la estimación mensual correspondiente a las sección II Gasto en alimentos, bebidas y tabaco para el hogar o para regalar a personas ajenas al hogar, transporte público, programas sociales (Liconsa y Diconsa) y por último hábitos de compras, todo esto se anota en el Cuadernillo de gastos diarios.

El séptimo día de la decena, se recoge el Cuadernillo de gastos diarios, una vez terminadas las entrevistas, se entregan las cargas de trabajo al supervisor; quien a su vez las entrega al jefe de supervisores.

El octavo día se lleva a cabo la reunión general con los equipos de campo y se aclaran dudas de la decena anterior, el jefe de supervisores entrega al REP, las cargas de trabajo de la decena anterior y recibe las cargas de la siguiente decena, para entregárselas al supervisor.

El supervisor de la siguiente decena hace entrega de la carga de trabajo y de los paquetes con los materiales correspondientes. El noveno y décimo día son de descanso.

El siguiente esquema muestra las actividades del entrevistador:

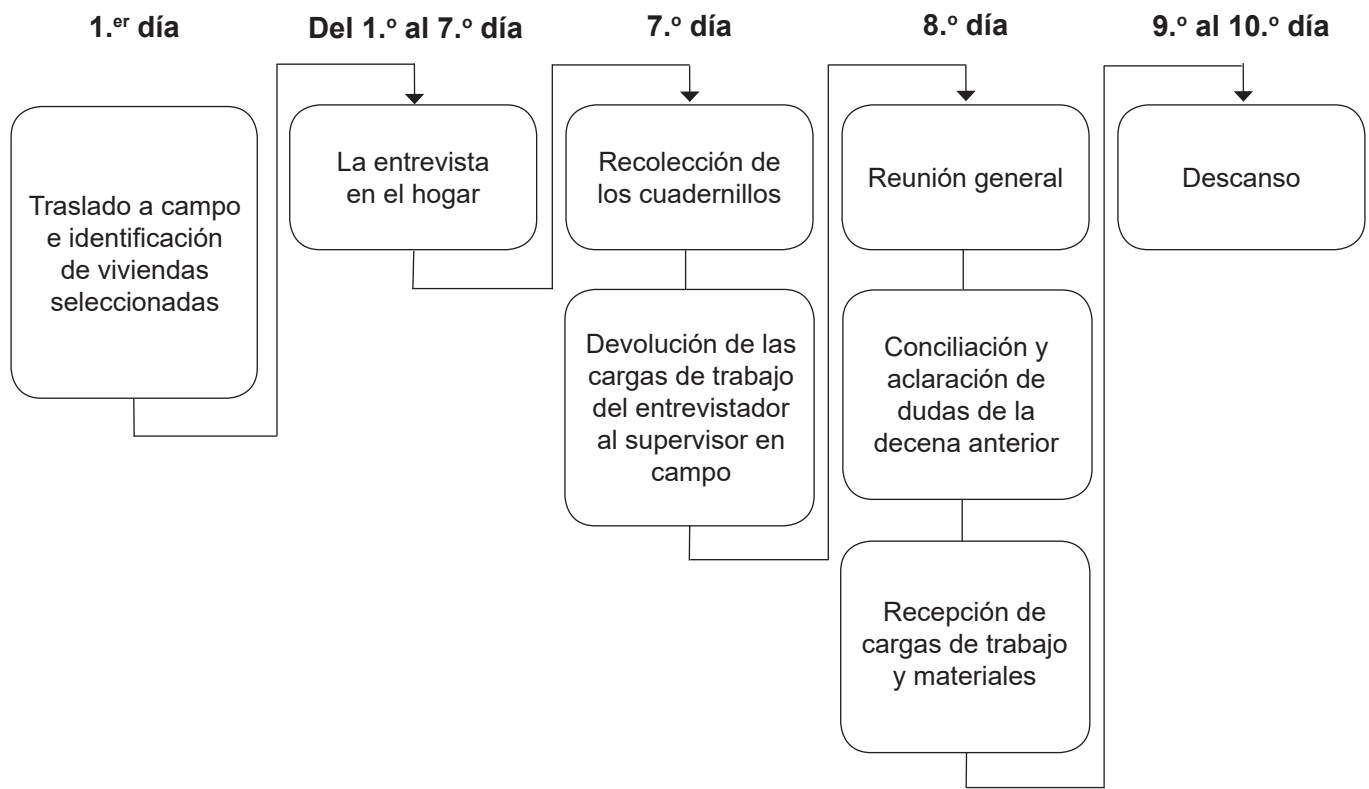

7.1.2 Procedimientos para el control del levantamiento de la ENIGH 2024

Control de la muestra

Para facilitar el control de la muestra se le asignó a cada hogar un número de identificación único a nivel nacional que está integrado por dos números: el primero es el FOLIOVIV que se compone de 10 dígitos y que identifica la vivienda, y el segundo llamado FOLIOHOG que es de un dígito e identifica la cantidad de hogares en la vivienda:

FOLIOVIV

- Los primeros siete dígitos se conforman a partir del número de UPM
- El octavo dígito indica la decena en que se programó levantar la información. Del 1 al 9 y 0 para la decena 10
- Los dígitos noveno y décimo corresponden a un número consecutivo de selección de la vivienda en la UPM

FOLIOHOG

- Este dígito nos indica la cantidad de hogares que habitan en la vivienda.

El hogar 1 es el hogar inicialmente entrevistado, el cual contesta el apartado de vivienda. Cuando en una misma vivienda se encontró más de un hogar, estos otros hogares también fueron objeto de entrevista. Para ellos, el número de FOLIOVIV coincide con el FOLIOVIV del hogar inicialmente entrevistado, diferenciándose en el FOLIOHOG que puede ser de 2 al 5, dependiendo del número de hogares que se hayan encontrado.

Cargas de trabajo

Se determinó que en la ENIGH 2024 la carga de trabajo por entrevistador fuera de seis viviendas por decena, y los supervisores tuvieran bajo su vigilancia a un promedio de tres entrevistadores.

Procedimiento de identificación de las viviendas

Primer paso

Fue identificar la manzana utilizando el croquis y listado de viviendas.

Segundo paso

Se identificó el recorrido que se utilizó en la elaboración del croquis y el listado de vivienda. La elaboración se llevó a cabo a partir de la esquina noroeste de la manzana en donde se encontraron la(s) vivienda(s) seleccionada(s).

Tercer paso

El personal se dirigió a la esquina más próxima a la calle en la que se ubicaban la(s) vivienda(s) seleccionada(s) basándose en el número progresivo que se tiene en el croquis.

Cuarto paso

Se identificó una a una de las estructuras o rasgos físicos en el mismo orden en que indica el croquis, se identificó el número de predios que existen entre la esquina y la vivienda seleccionada, así como los servicios más cercanos, lotes baldíos, construcciones, comercios, etc., de igual manera se identificó físicamente a la(s) vivienda(s) ubicada(s) a los costados de la seleccionada(s) como lo indicó el croquis.

Quinto paso

Se confrontó con el listado los datos de domicilio y la descripción de la vivienda seleccionada.

Entrevista

La captación de la información se realizó mediante el método de entrevista directa, durante siete visitas consecutivas.

7.2 Operativo de supervisión

Con el fin de obtener datos confiables, durante la recolección de la información se llevó a cabo un control efectivo de la calidad de los datos de la encuesta, el cual se logró con una buena supervisión del trabajo de campo.

La actividad fundamental del supervisor fue la de vigilar y controlar el cumplimiento del trabajo de campo dentro de los tiempos preestablecidos, así como garantizar la calidad de la información.

7.2.1 Supervisión de la Oficina Estatal

Para el buen cumplimiento de la supervisión, esta fue dividida en tres partes.

Observación directa

El supervisor acompañó al entrevistador durante algunos días de la decena a recabar la información al hogar, observando la habilidad y destreza con que este realiza la entrevista. Al terminar, el supervisor debía informar al entrevistador de los errores observados y señalar la forma de corregirlos. Esta actividad se realizó todas las decenas del levantamiento, bajo un programa de supervisión establecido.

Verificación de no respuesta

Consistió en tratar de recuperar el mayor número posible de cuestionarios que presentaron no respuesta, realizando con los informantes una eficiente labor de convencimiento cuando había una negativa al momento de solicitar la información; en cambio, cuando la entrevista no se había logrado debido a un error en los listados de vivienda, debía verificarse y reportar al REP, para que este a su vez lo reporte al área de la Muestra Maestra.

Revisión y crítica de la información

El supervisor se encargó de solicitar a los entrevistadores los cuestionarios para hacer una revisión de los apartados que ya contenían información. Por otro lado, durante el levantamiento se realizaron supervisiones de apoyo por parte del personal de Oficina Regional, con el objetivo de reinstruir sobre aspectos que no estuvieran entendidos correctamente desde los cursos impartidos por el instructor supervisor estatal, además de verificar que las actividades se cumplieran de acuerdo a las instrucciones contenidas en cada uno de los manuales operativos. Así como resolver problemáticas y dudas durante el levantamiento.

7.2.2 Supervisión de la Oficina Central

Durante el levantamiento de la información, se llevaron a cabo las supervisiones necesarias por parte de Oficinas Centrales, con el fin de dar un seguimiento integral a los procedimientos conceptuales y operativos, de las decenas 2 a la de recuperación.

Los criterios principales que se siguieron para determinar las entidades federativas a visitar en tareas de supervisión por parte de las Oficinas Centrales del INEGI, se plantean enseguida, sin que el orden de enunciación signifique un indicador de importancia:

- Menor experiencia del personal responsable de la ENIGH 2024 en las Coordinaciones Estatales del INEGI en levantamientos previos tipo ENIGH o MCS, así como resultados de las evaluaciones posteriores a la capacitación
- Entidades con el menor grado de avance decenal en la cobertura del operativo y tipo de no respuesta
- Entidades con el menor grado de avance decenal en la liberación de folios capturados
- Presencia de eventos inesperados de corte climático, social o de inseguridad pública
- Entidades con el mayor número de renunciaciones de personal operativo
- Solicitud expresa de las Coordinaciones Estatales

7.3 Los procesos de captura y de validación en las Coordinaciones Estatales

La captura y la validación son dos procesos que se realizaron posteriormente al trabajo de campo.

Ambos procesos iniciaron el día 20 de agosto y finalizaron el 12 de diciembre de 2024. La distribución de cargas de trabajo también se organizó en decenas. Cabe aclarar que tanto la captura como la validación para la decena de recuperación se concluyeron en los mismos tiempos.

7.3.1 Actividades de la captura

La captura consistió en llevar a cabo la transferencia de la información de los cuestionarios que fueron totalmente contestados a medios electrónicos a través del IKTAN, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el proceso de captura de la ENIGH 2024.

El octavo día de la decena, el responsable de captura validación junto con su equipo de trabajo inició la captura de los cuestionarios levantados por cada entrevistador, organizada por paquetes de cuestionarios de cada folio con resultado de entrevista completa, siguiendo el orden establecido:


- Portada del paquete (ENIGH-1)
- Cuestionario de hogares y vivienda
- Cuestionarios para personas menores de 12 años
- Cuestionarios para personas de 12 o más años

- Cuestionarios para negocios del hogar
- Cuestionario de gastos del hogar
- Cuadernillo de gastos diarios

Adicionalmente, el IKTAN permitió registrar y conocer el avance o la conclusión de las cargas de trabajo.

7.3.2 Actividades de validación

En forma paralela a la captura, en las Coordinaciones Estatales se inició la validación de los folios con captura completa, que cumplieran con la verificación de rangos válidos. La validación consistió en la aplicación de los criterios de validación mediante los procesos de analista e ISE, con el objetivo de depurar los datos de posibles errores de captura, incongruencias y omisiones, antes de liberarlos y almacenarlos en la base de datos de validación.

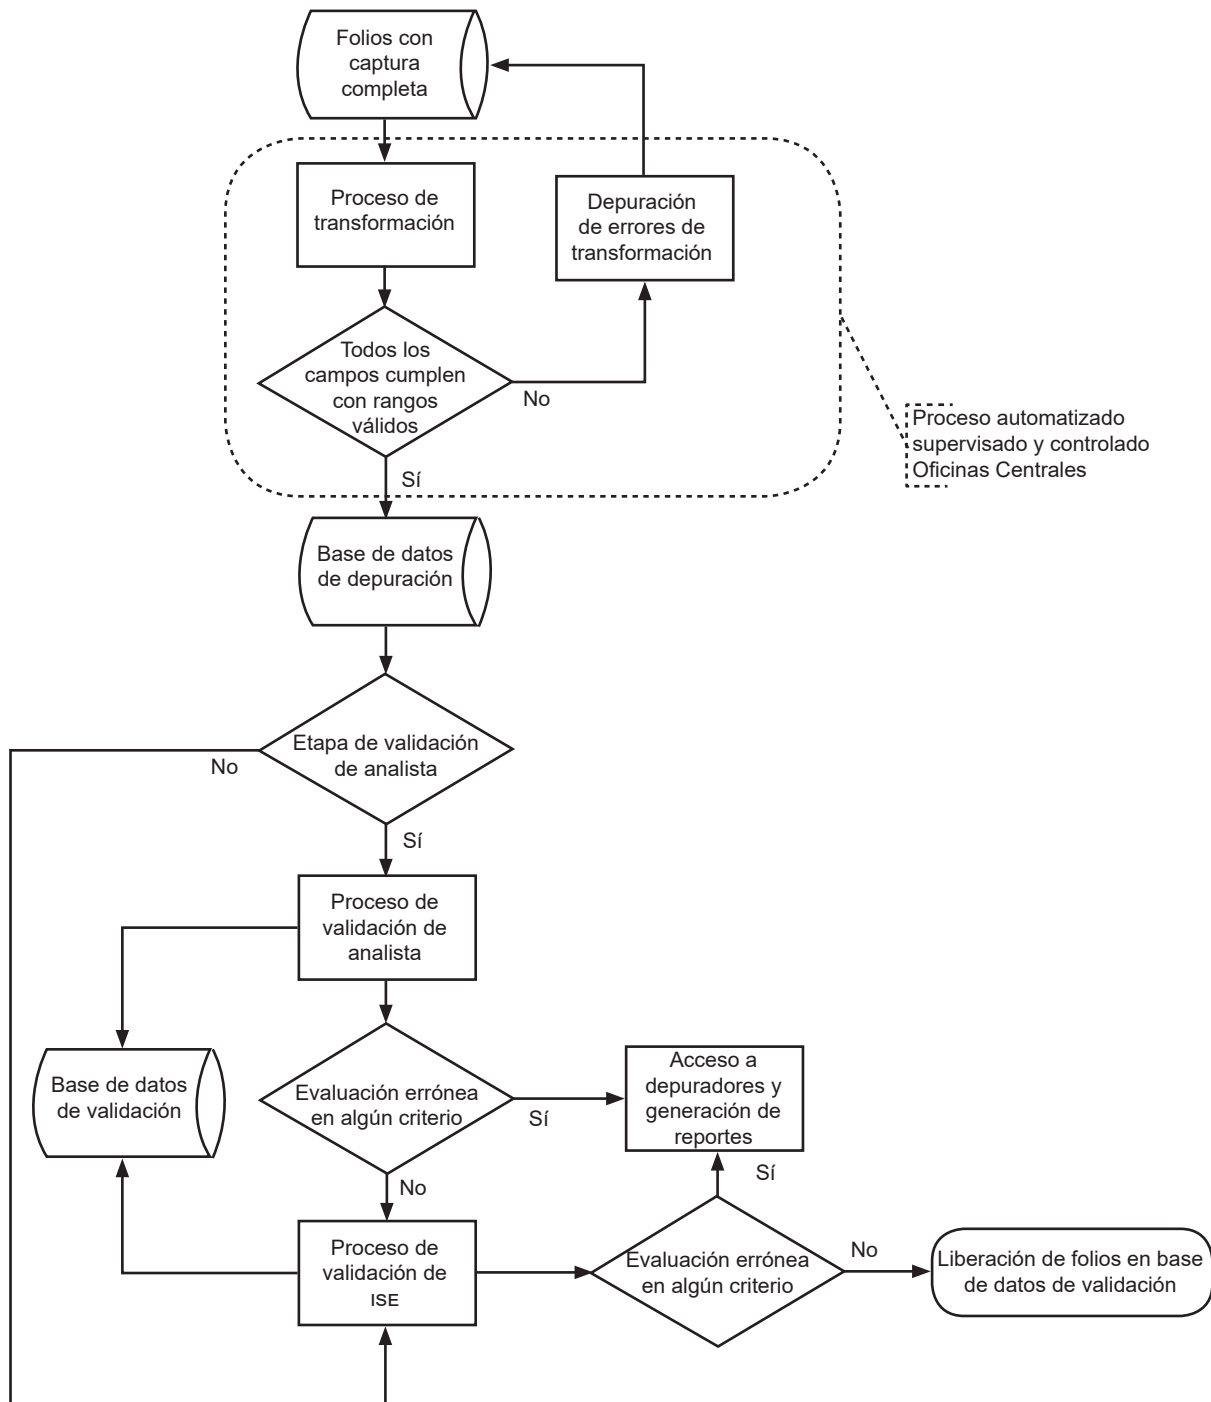

7.3.3 Calendario de captura y validación

El calendario de captura y validación de la información quedó de la siguiente manera:

Decena	Reunión General	Captura y verificación de folios (Cuestionarios)	Validación de la información (Cuestionarios)
	Captura de la forma de control ENIGH-1		
1	19 ago	Del 20 al 31 de ago	Del 22 ago al 04 de sep
2	28 ago	Del 29 ago al 11 de sep	Del 02 al 13 de sep
3	9 sep	Del 10 al 23 de sep	Del 12 al 25 de sep
4	17 sep	Del 18 sep al 01 de oct	Del 20 sep al 03 de oct
5	27 sep	Del 30 sep al 11 de oct	Del 02 al 15 de oct
6	7 oct	Del 8 al 21 de oct	Del 10 al 23 de oct
7	17 oct	Del 18 al 31 de oct	Del 22 oct al 04 de nov
8	28 oct	Del 29 de oct al 11 de nov	Del 31 de oct al 13 de nov
9	6 nov	Del 07 al 20 de nov	Del 11 al 22 de nov
10	19 nov	Del 19 nov al 02 de dic	Del 21 nov al 04 de dic
11 (Recuperación)	26 nov	Del 27 nov al 10 de dic	Del 29 de nov al 12 de dic

7.3.4 Calendario de actividades de la ENIGH 2024

Para poder cumplir en el tiempo establecido de la entrega de información, se elaboró un calendario de actividades para cada una de las decenas que a continuación se presentan:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL ENTREVISTADOR POR DECENA										
ENIGH - 2024										
D E C E N A	DÍAS DE LA DECENA									
	1er. DÍA	2° DÍA	3er. DÍA	4° DÍA	5° DÍA	6° DÍA	7° DÍA	8° DÍA	9° DÍA	10° DÍA
	TRASLADO E IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS	CONTINUA LA ENTREVISTA					SE RECOGEN CUADERNILLOS	REUNIÓN GENERAL	D E S C A N S O	
	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTADA						DEVOLUCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO DEL ENTREVISTADOR AL SUPERVISOR EN CAMPO	REUNIÓN CON TU SUPERVISOR PARA CONSULTAS Y DUDAS EN CAPTURA DE LA DECENA ANTERIOR		
	INICIO DE ENTREVISTA							RECEPCIÓN DE TU CARGA DE TRABAJO PARA LA SIGUIENTE DECENA		
1	AGOSTO 11	AGOSTO 12	AGOSTO 13	AGOSTO 14	AGOSTO 15	AGOSTO 16	AGOSTO 17	AGOSTO 18	AGOSTO 19	AGOSTO 20
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
2	AGOSTO 21	AGOSTO 22	AGOSTO 23	AGOSTO 24	AGOSTO 25	AGOSTO 26	AGOSTO 27	AGOSTO 28	AGOSTO 29	AGOSTO 30
	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
3	AGOSTO 31	SEPTIEMBRE 01	SEPTIEMBRE 02	SEPTIEMBRE 03	SEPTIEMBRE 04	SEPTIEMBRE 05	SEPTIEMBRE 06	SEPTIEMBRE 07	SEPTIEMBRE 08	SEPTIEMBRE 09
	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES
4	SEPTIEMBRE 10	SEPTIEMBRE 11	SEPTIEMBRE 12	SEPTIEMBRE 13	SEPTIEMBRE 14	SEPTIEMBRE 15	SEPTIEMBRE 16	SEPTIEMBRE 17	SEPTIEMBRE 18	SEPTIEMBRE 19
	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
5	SEPTIEMBRE 20	SEPTIEMBRE 21	SEPTIEMBRE 22	SEPTIEMBRE 23	SEPTIEMBRE 24	SEPTIEMBRE 25	SEPTIEMBRE 26	SEPTIEMBRE 27	SEPTIEMBRE 28	SEPTIEMBRE 29
	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
6	SEPTIEMBRE 30	OCTUBRE 01	OCTUBRE 02	OCTUBRE 03	OCTUBRE 04	OCTUBRE 05	OCTUBRE 06	OCTUBRE 07	OCTUBRE 08	OCTUBRE 09
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES
7	OCTUBRE 10	OCTUBRE 11	OCTUBRE 12	OCTUBRE 13	OCTUBRE 14	OCTUBRE 15	OCTUBRE 16	OCTUBRE 17	OCTUBRE 18	OCTUBRE 19
	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
8	OCTUBRE 20	OCTUBRE 21	OCTUBRE 22	OCTUBRE 23	OCTUBRE 24	OCTUBRE 25	OCTUBRE 26	OCTUBRE 27	OCTUBRE 28	OCTUBRE 29
	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
9	OCTUBRE 30	OCTUBRE 31	NOVIEMBRE 01	NOVIEMBRE 02	NOVIEMBRE 03	NOVIEMBRE 04	NOVIEMBRE 05	NOVIEMBRE 06	NOVIEMBRE 07	NOVIEMBRE 08
	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
10	NOVIEMBRE 09	NOVIEMBRE 10	NOVIEMBRE 11	NOVIEMBRE 12	NOVIEMBRE 13	NOVIEMBRE 14	NOVIEMBRE 15	NOVIEMBRE 16	NOVIEMBRE 17	NOVIEMBRE 18
	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES
11*	NOVIEMBRE 19	NOVIEMBRE 20	NOVIEMBRE 21	NOVIEMBRE 22	NOVIEMBRE 23	NOVIEMBRE 24	NOVIEMBRE 25	NOVIEMBRE 26	NOVIEMBRE 27	NOVIEMBRE 28
	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES

*Decena de recuperación para algunas Oficinas Estatales que así lo requieran

7.4 Operativo de seguimiento y control de la ENIGH 2024

Con el fin de llevar un registro de todas las actividades desarrolladas por el personal operativo, durante el levantamiento se diseñó un sistema de seguimiento y control de la ENIGH, cuyo objetivo es conocer a detalle el desarrollo del operativo de campo.

7.4.1 Actividades durante el seguimiento y control

El responsable estatal del proyecto es el encargado de llevar un registro del personal y de la asignación de las cargas de trabajo en cada decena, así como de las actividades desarrolladas en campo en su entidad, con el propósito de organizar la información recopilada, llevar el control de la muestra y hacer un diagnóstico preventivo basado en el análisis crítico y sistemático.

Para suministrar esta información se cuenta con dos instrumentos: las formas de control del trabajo de campo y los reportes del IKTAN.

Estas formas de control y reportes están diseñadas para proporcionar información en dos etapas:

- Primera etapa: durante el trabajo de campo son utilizadas las formas de control
- Segunda etapa: estos reportes proporcionan información después de la captura que se hace, una vez que llegan de campo las formas de control

7.4.2 Formas de control del trabajo de campo

En seguida se menciona el objetivo y uso de cada una de estas formas:

1. Control por folio del entrevistador y supervisor (ENIGH-1).

Su objetivo es registrar la asignación de cargas de trabajo al entrevistador, el resultado de entrevista tanto del hogar como de cada uno de los cuestionarios que le corresponden, así como llevar el control de las actividades de supervisión, del seguimiento de la no respuesta y de los retornos a campo.

Los responsables de llenar la forma son el entrevistador y el supervisor de entrevistadores.

2. Observación directa a la entrevista (ENIGH-2).

Su objetivo es observar el desempeño del entrevistador en la aplicación de la entrevista (dominio de cuestionarios, manejo de conceptos y formulación de preguntas) con el fin de evaluar y apoyar su trabajo.

El responsable del llenado es el supervisor de entrevistadores.

3. Reporte Decenal (ENIGH-6).

Su objetivo es dar a conocer a Oficina Central la situación sobre lo acontecido durante el levantamiento decenalmente en cada oficina.

El responsable del llenado es el responsable estatal del proyecto.

4. Cuestionario de verificación.

Su objetivo es verificar la veracidad y calidad de algunos datos recolectados con anterioridad, así como conocer la opinión del informante sobre la actitud del entrevistador.

El responsable del llenado de este formato es el supervisor regional.

5. Control de resultados de entrevista del supervisor de entrevistadores.

Su objetivo es tener el registro de los resultados de entrevista por entrevistador, contar con el total de códigos de resultado de entrevista por carga de trabajo del supervisor de entrevistadores y tener el registro de los folios de seguimiento.

El responsable del llenado de este formato es el supervisor de entrevistadores.

6. Control de resultados de entrevista del jefe de supervisores.

Su objetivo es tener el registro del total de resultados de entrevista por decena, así como del seguimiento de cada uno de los supervisores a su cargo.

El responsable del llenado de este formato es el jefe de supervisores.

7. Cuestionario de verificación del jefe de supervisores.

Su objetivo es corroborar el trabajo realizado por el personal operativo durante la captación de la información en los hogares.

El responsable del llenado de este formato es el jefe de supervisores.

8. Informe de actividades por folio del jefe de supervisores

Su objetivo es observar el desempeño del supervisor de entrevistadores en la aplicación de los procedimientos inherentes a sus funciones así como la revisión que lleva a cabo de los cuestionarios previamente revisados.

El responsable del llenado de este formato es el jefe de supervisores.

7.4.3 Reportes del IKTAN

Al terminar la captura de las formas de control con la información que se genera en campo, son procesadas y transformadas en reportes.

Los diversos reportes son una herramienta útil para medir el avance en la recolección de la información y para evaluar el desempeño del personal en campo. Ayuda a la elaboración en la planeación de las actividades y la toma de decisiones. Cabe mencionar que a su vez se subdividen en reportes de campo y reportes después de captura.

Reportes de campo

Estos reportes proporcionan información de campo y se elaboran entre el 8.º y el 10.º día de todas las decenas.

A continuación se mencionan el objetivo y uso de cada uno de estos reportes:

1. Avance y acumulado decenal estatal de resultados de entrevista en campo (REP-1).

El objetivo del reporte es dar a conocer el avance y acumulado decenal de acuerdo con el resultado de entrevista en campo.

2. Acumulado de folios con no respuesta (REP-3).

En este reporte se listan los hogares con no respuesta y las observaciones del supervisor desde la decena dos hasta la once con el objetivo de monitorear el tipo de no respuesta que se tiene durante el levantamiento.

3. Acumulado estatal de folios con resultado de entrevista A7 entrevista incompleta (REP-4).

Este reporte muestra un listado de los hogares que no proporcionaron completa la información, para llevar un control y análisis de su posible recuperación.

4. Planeación estatal de la muestra decenal (REP-5).

Este reporte ayuda a que el REP vea si ha adelantado viviendas o si ha dejado pendientes por levantar, por circunstancias ajenas a su voluntad.

El encargado de generar estas formas de control (REP-1; REP-3; REP-4 y REP-5) así como de su análisis es el responsable estatal del proyecto.

5. Avance y acumulado estatal de captura validación (REP-6).

El objetivo de este reporte es controlar los cuestionarios de las viviendas que nos dieron la entrevista completa, en las etapas de tratamiento de información.

6. Avance por estatus detallado (REP-7).

El objetivo de este reporte es conocer el proceso que lleva y el estatus en que se encuentran cada una de las viviendas de la decena.

7. Avance por estatus detallado y Resultado de Entrevista (REP-8).

El objetivo de este reporte es conocer el proceso que lleva, el estatus en el que se encuentran cada una de las viviendas de la decena y su resultado de entrevista.

8. Reporte del trabajo de campo según entrevistador (REP-15-O).

Este reporte muestra por decena y por entrevistador la carga de trabajo y los resultados obtenidos en códigos de respuesta recuperable y no recuperable además de total de números de autorización, observaciones directas y retornos a campo.

9. Reporte de trabajo de campo del entrevistador seleccionado (REP-16).

Este reporte muestra la cantidad de incidencias reportadas por el supervisor y el jefe de supervisores.

10. Reporte de Supervisión (REP-17).

Este reporte es un concentrado por oficina y por decena de las actividades de identificación de viviendas, observación directa, verificación de la no respuesta y revisión de la información, así como el total de folios con y sin entrevista, si ubicaron correctamente la vivienda y si aplicó observación directa.

11. Número de cuestionarios por folio.

Listados de viviendas con resultado de entrevista y número de cuestionarios que la conforman, se generan con la finalidad de archivar los cuestionarios.

El encargado de generar estas formas de control (REP-5, REP-6, REP-7, REP-8 y número de cuestionarios por folio) así como de su análisis es el responsable de captura y validación.
